

बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिका कार्यालय
ताकुकोट, गोरखा



प्राबिधिक शाखा

चौमासिक समिक्षा

योजनाको विवरण

□ कुल योजना संख्या :

✓ गाउँपालिका स्तरीय योजना

✓ वार्ड स्तरीय योजना : १४५ वटा

□ ठुला योजना : बहुवर्षीय

- गाउँपालिका भवन
- हुण्डीखोला-खार्चोक-ठोत्तेरी-भण्डारी गाउँ-रन्चोक-बारपाक सडक
- सौरपानी सडक
- सभाहल भ्यु टावर

कार्यहरु (077-078) (प्रथम चौमासिक)

क) विभिन्न ठेक्का तथा गै.स.स.

क्र.स	योजनाहरु	हालको कार्यान्वयनको स्थिति
१.	डोजर खरिद	सम्पन्न भएको
२.	पहिलो ठेक्का कार्य (८ सडकहरु)	आसयको सुचनाको क्रममा
३.	दोश्रो ठेक्का कार्य (२ सडकहरु)	मुल्यांकन क्रममा
४.	गा.पा. भवन निर्माण कार्य (गत आ.ब.)	भुइँतल्ला निर्माण क्रममा (वित्तीय-१७%)
५.	विभिन्न झो.पु. निर्माण कार्य (गत.आ.ब.)	निर्माणको क्रममा
६.	झोलुंगे पुल प्राविधिक सहयोगको लागि गै.स.स. छनोट	सम्पन्न भएको
७.	वार्ड कार्यालय-०८ (गत आ.ब.)	निर्माण क्रममा (वित्तीय-४८%)

ख) उपभोक्ता समिति

क्र. स.	योजनाहरु	हालको कार्यान्वयनको स्थिति
१.	उपभोक्ता समिति अभिमुखीकरण	सुरुवात नभएको
२.	योजनाहरुको समिति गठन	सुरुवात नभएको
३.	फिल्ड सर्वे	सर्वे क्रममा रहेको
४.	नक्सा पास तथा अभिलेखीकरण	नक्सा पास तथा अभिलेखीकरण क्रममा रहेको

नक्सा पास तथा अभिलेखीकरणको लागि किताब छाप्रे क्रममा रहेको ।

आगामी कार्य योजना (द्वितीय

क) ठेक्का कार्य क)

क्र.स.	कार्यक्रम	समय
१.	पहिलो ठेक्का कार्य (८ सडकहरु) आसय सूचना,सम्झौता तथा कार्यादेश	मङ्सिर महिना सम्ममा
२.	ठुला सडक (२ सडक)आसय,सम्झौता तथा कार्यादेश	पुस १५ सम्ममा
३.	वार्ड कार्यालय-०८ सम्पन्न	पुष १५ सम्म
४.	गाउँपालिका भवन /सभाहल/भ्यु टावर निर्माण कार्य	निरन्तर

ख) उपभोक्ता

क्र.स	कार्यक्रम	समय
१.	समिति अभिमुखीकरण कार्य	मङ्सर
२.	उपभोक्ता समिति गठन	मङ्सर
३.	सर्भे तथा लागत अनुमान	पौष/माघ १५ सम्म
४.	सम्झौता	माघ सम्म
५.	योजना अनुगमन	माघ फाल्गुन (निरन्तर)
५.	झोलुंगे पुल निर्माण कार्य	निरन्तर (मङ्सर/पुष/माघ/फाल्गुन)

समस्याहरु :

- ▶ झोलुंगे पुल गै.स.स.छनोट संगै आएको समस्या
- ▶ उपभोक्ता अभिमुखीकरण तथा सम्झौता नहुनु
- ▶ बारपाक भ्यु टावर साईट
- ▶ लागत अनुमान क्रममा जनश्रमदान
- ▶ निर्माण ब्यबसायीबाट समयमा निर्माण कार्य सुरुवात नगर्नु (जस्तै बारपाक भ्यु टावर , गा.पा. सभाहल)

उपभोक्ता समिति गठन तथा अभिमुखीकरण ढिला सुस्ती हुँदा प्राविधिक सर्वे दोहोराउन पर्ने तथा कार्यन्वयनमा समस्या हुने सक्ने

समाधानका उपायहरु :


- ▶ झोलुंगे पुल जिम्मेवार संस्था संग छलफल तथा बैठक ।
- ▶ उपभोक्ता अभिमुखीकरण समयमा सम्पन्न ।
- ▶ बारपाक भ्यु टावर / समन्धित क्षेत्रबाट निर्माण सहयोग समिति गठन ।
- ▶ लागत अनुमान क्रममा जनश्रमदान के गर्ने निर्णय ।

फोटोहरु:



निर्माणाधीन गाउँपालिका भवन



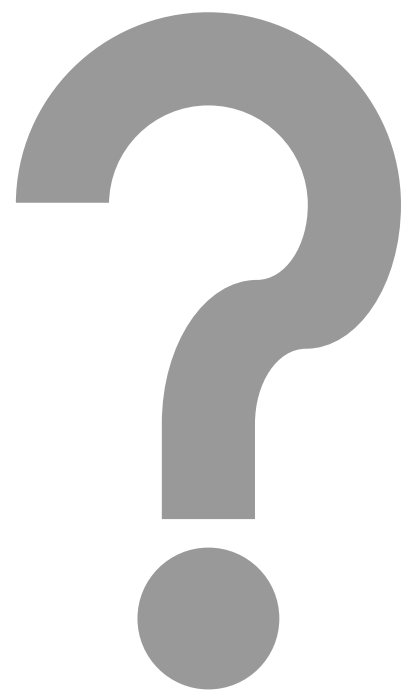

Thank You
