



बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
ताकुकोट, गोरखा

भौतिक पूर्वाधार विकास शाखा

प्रस्तोता: ई. अभिनव गौतम
प्रमुख, भौतिक पूर्वाधार विकास शाखा



प्रस्तुतिका विषयहरू

- शाखाको परिचय
- बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकाका पूर्वाधारहरू
- आ.व. २०७९/०८० को पूर्वाधार योजना
 - आ.व. २०७९/०८० का कार्ययोजनाहरू
 - आ.व. २०७९/०८० को कार्यसमीक्षा
 - पूर्वाधार क्षेत्रको बजेट र खर्च
- आ.व. २०८०/०८१ का कार्ययोजनाहरू तथा Work Schedule Plan
- समस्याहरू
- अन्य (पूर्वाधार ल्याब)




प्राविधिक शाखा

- आजको युग विज्ञान तथा प्रविधिको युग हो ।
- गाउँपालिकाको विकासका लागि भौतिक र प्राकृतिक स्रोत/साधनको जति मात्रामा भूमिका हुन्छ, त्यसभन्दा बढी भूमिका जनशक्तिको हुन्छ ।
- विकासका लागि मानवीय पुँजी आवश्यक हुन्छ र सोको निर्माण गर्न प्राविधिक शाखा अपरिहार्य हुन्छ ।
- प्राविधिक ज्ञान प्राप्त व्यक्तिले मात्रै प्राकृतिक स्रोत र साधनको उचित उपयोग गर्न सक्छ ।
- प्राविधिक शाखा प्राविधिक रूपले जति शक्तिशाली हुन्छ त्यति नै गाउँपालिका शक्तिशाली हुने हो; विकास हुने हो ।
- समयानुकूल विकास हुन सकेन भने कहिलै पनि समाज/संस्थाले विकास गर्न सक्दैन ।



प्राविधिक शाखा

- विज्ञान एउटा अतिरिक्त आत्मा हो, प्रविधि भनेको त्यो अतिरिक्त आत्माले उब्जाएको आविस्कार हो ।
- मान्छेले आदिम कालदेखि नै प्रविधिको प्रयोग गर्दै आएको हो ।
- गाउँपालिकाको माटोसुहाउँदो प्रविधिको विकास गर्नका लागि प्राविधिक शाखाको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ ।
- विज्ञान $\longrightarrow$ रूख
- प्रविधि $\longrightarrow$ फल
- शाखा $\longrightarrow$ हाँगा/हात
- प्रविधि=प्र+विधि $\longrightarrow$ विशेष विधि/वैज्ञानिक तरिकाले गरिने विधि
- प्राविधिक=प्रविधि+इक



प्राविधिक

- कृषि प्राविधिक
- पशु प्राविधिक
- स्वास्थ्य प्राविधिक
- पूर्वाधार प्राविधिक



पूर्वाधार

पूर्वाधार : पूर्व + आधार

- विकास, निर्माण, उद्योगधन्दा आदिको स्थापनाका लागि आवश्यक पर्ने वस्तु, सीप, ज्ञान र भौतिक संरचना आदि ;
- कुनै काम थालनी गर्न आवश्यक पर्ने पहिलो आधार ;
- विकासको पूर्व आधार/जग; विकासको पूर्व सर्त; दक्ष मानवबाट गरिने विकासात्मक कार्य ;
- कुनै पनि गाउँपालिकाका कति विकसित छ भनेर भौतिक चस्माले आकलन गर्ने आधार भनेको पूर्वाधारको उपलब्धता ;
- आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको पहिलो सर्त ;
- नेपालमा पनि पूर्वाधार विकासबिना सामाजिक रूपान्तरण सम्भव छैन भन्ने सोच नागरिक र राजनीतिक दलहरूमा पाइनु ज्यादै सकारात्मक कुरा ;
- राज्य विकासशील अवस्थामा रहँदासम्म पूर्वाधार भनेको निर्माण ;

पूर्वाधार

```
graph TD; A((पूर्वाधार)) --- B((भौतिक पूर्वाधार)); A --- C((सामाजिक पूर्वाधार)); B --- D[सडक, भवन, विद्युत, टेलिफोन, खानेपानी, ढल, सिँचाइ ...]; C --- E[शिक्षा, स्वास्थ्य ...];
```

भौतिक पूर्वाधार

सडक, भवन, विद्युत, टेलिफोन, खानेपानी, ढल,
सिँचाइ ...

सामाजिक पूर्वाधार

शिक्षा, स्वास्थ्य ...



पूर्वाधार शाखाको हालको अवस्था

जनशक्ति-विवरण

- ई. अभिनव गौतम
- स.ई. उज्वल गिरि
- अ.स.ई. विजय गुरुङ
- अ.स.ई. अन्जु थापा
- अ.स.ई. सुनिल मोक्तान
- खा.पा.स.टे. वसन्त भट्ट
- अमिन प्रेम गुरुङ
- ब्याक हो अपरेटर श्री रोहित थापा मगर
- ट्रीपर चालक श्री प्रकाश गुरुङ



बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकाका पूर्वाधारहरू

— सामुदायिक भवन ७६ वटा

- वडा नं. १ ... १ वटा
- वडा नं. २ ... ४ वटा
- वडा नं. ३ ... ९ वटा
- वडा नं. ४ ... २१ वटा
- वडा नं. ५ ... १४ वटा
- वडा नं. ६ ... १३ वटा
- वडा नं. ७ ... ८ वटा
- वडा नं. ८ ... ६ वटा

— गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन ... एक

- बहुद्देशीय सभाहल ... एक
- खानेपानी
 - फेरोसिमेन्ट टंकी ...
 - आर.सी.सी. टंकी ...
- वडा कार्यालय भवन
 - आफ्नै भवन भएको पाँच वटा
 - नव निर्मित ... एक (वडा नं. ८)
 - भाडामा बसेको एक (वडा नं. ६)



बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकाका पूर्वाधारहरू

- सडक (कि.मी.) ४१७.४८
- पालिका स्तरीय (कि.मी.) १३६.७५
- ग्रामिण (कि.मी.) ६९.०९
- कृषि (कि.मी.) ७९.८३
- गोरेटो (कि.मी.) १३१.८२
- रंगशाला ... एक (गा.पा. स्तरीय)
- बसपार्क ... एक वटा
- आधारभूत अस्पताल ... एक वटा
- स्वास्थ्य चौकी ... सात वटा
- आयुर्वेद औषधालय ... एक वटा
- आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र ... एक वटा
- सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई ... दुई वटा



आ.व. २०७९/८० का कार्ययोजनाहरू

- पुराना घरहरूको अभिलेखीकरण ;
- घर नक्सा पास कार्यलाई निरन्तरता ;
- एक वडा एक पार्क निर्माण ;
- चौतारा सुधार ;
- वडा-गाउँपालिका सडकको स्तरोन्नति ;
- पर्यटनमुखी गाउँपालिकाको निर्माण ;
- प्राविधिक सीपमूलक तालिम सञ्चालन (Staffs, Users Committee, Workers) ;
- प्राविधिक प्रयोगशाला संचालन गराउने ;
- प्रयोगशालीय परीक्षणका आधारमा परिमाण र गुणस्तरमा कडाइ ;
- गा.पा. अन्तर्गतका पूर्वाधारहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन ।

आ.व. २०७९/०८० सम्म क्रमागत ठेक्काहरूको समिक्षा

क्र.सं.	कार्यक्रम/योजनाको नाम	सञ्चालन भएको			स्वीकृत बजेट	जम्मा खर्च	उपभोक्ता समिति/ठेकेदार	भौतिक प्रगति	वित्तिय प्रगति	प्रगतिको अवस्था (सम्पन्न/क्रमागत/अधुरो)	कैफियत
		पालिका	वडा नं.	टोल							
१	बारपाक भ्यू टावर निर्माण (क्रमागत)	बा.सु.गा.पा.	२	बारपाक	45,00,000.00	18,80,637.13	ठेकेदार	100.00%	41.79%	सम्पन्न	अघिल्लो वर्षको क्रमागत योजना
२	हुडीखोला-खार्चोक-ठोद्रेरी-भण्डारीगाउँ-रन्चोक-बारपाक सडक स्तरउन्नति (क्रमागत)	बा.सु.गा.पा.	३/४/२	स्वर्गरा-सौरपानी-बारपाक	2,10,00,000.00	1,71,82,975.66	ठेकेदार	100.00%	81.82%	सम्पन्न	
३	१५ शैयाको आधारभूत अस्पताल निर्माण (क्रमागत)	बा.सु.गा.पा.	४	सौरपानी	शसर्त	4,57,66,218.63	ठेकेदार	55.00%	-	क्रमागत	
४	दिल बहादुर रम्तेल स्मृति पार्क निर्माण (क्रमागत)	बा.सु.गा.पा.	८	जरांग	समपुरक	1,36,67,876.59	ठेकेदार	95.00%	-	क्रमागत	
५	चनौटे-तामालाबोट-पाल्खु सडक स्तरउन्नति (क्रमागत)	बा.सु.गा.पा.	५/६	ता.मा.ला.बोट	35,00,000.00	25,64,110.77	ठेकेदार	100.00%	73.26%	सम्पन्न	

आ.व. २०७९/०८० सम्म क्रमागत ठेक्काहरूको समिक्षा

क्र.सं.	कार्यक्रम/योजनाको नाम	सञ्चालन भएको			स्वीकृत बजेट	जम्मा खर्च	उपभोक्ता समिति/ठेकेदार	भौतिक प्रगति	वित्तिय प्रगति	प्रगतिको अवस्था (सम्पन्न/क्रमागत/अधुरो)	कैफियत
		पालिका	वडा नं.	टोल							
६	गाउँपालिका भवनको इन्टेरियर कार्य (क्रमागत)	बा.सु.गा.पा.	६	ताकुकोट	71,00,000.00	68,10,490.00	ठेकेदार	100.00%	95.92%	सम्पन्न	अघिल्लो वर्षको क्रमागत योजना
७	गाउँपालिकाको पूर्वाधार निर्माण (क्रमागत)	बा.सु.गा.पा.	६	ताकुकोट	13,00,000.00	12,03,827.25	ठेकेदार	100.00%	92.60%	सम्पन्न	
८	बारपाक बहुप्राविधिक शिक्षालयको छात्रावास निर्माण (क्रमागत)	बा.सु.गा.पा.	४	सौरपानी	21,00,000.00	18,66,397.59	ठेकेदार	100.00%	88.88%	सम्पन्न	

आ.व. २०७९/०८० मा लागेका नयाँ ठेक्काहरूको समिक्षा

क्र.सं.	कार्यक्रम/योजनाको नाम	सञ्चालन भएको			स्वीकृत बजेट	जम्मा खर्च	उपभोक्ता समिति/ठेकेदार	भौतिक प्रगति	वित्तिय प्रगति	प्रगतिको अवस्था (सम्पन्न/क्रमागत/अधुरो)	कैफियत
		पालिका	वडा नं.	टोल							
९	ढोडेनी सौरपानी सडक स्तरउन्नति (क्रमागत)	बा.सु.गा.पा.	४	सौरपानी	1,00,00,000.00	76,25,105.05	ठेकेदार	35.00%	76.25%	क्रमागत	नयाँ ठेक्का
१०	चनौटे पाल्खु सडक निर्माण समपुरक (क्रमागत)	बा.सु.गा.पा.	५	ता.मा.ला.बोट	1,35,00,000.00	1,26,50,382.30	ठेकेदार	45.00%	93.71%	क्रमागत	
११	मसार डाँडागाउँ पाल्खु सडक स्तरोन्नति (क्रमागत)	बा.सु.गा.पा.	६	डाँडागाउँ	80,00,000.00	75,60,937.20	ठेकेदार	100.00%	94.51%	सम्पन्न	
१२	झाँक्रीचोक धारापानी देउराली सडक स्तरउन्नति (क्रमागत)	बा.सु.गा.पा.	७	देउराली	45,00,000.00	42,36,730.90	ठेकेदार	80.00%	94.15%	क्रमागत	
१३	ट्रीपर खरीद	बा.सु.गा.पा.	६	ताकुकोट	50,00,000.00	47,50,000.00	आपूर्तिकर्ता	100.00%	95.00%	सम्पन्न	

आ.व. २०७९/०८० मा लागेका नयाँ ठेक्काहरूको समिक्षा

क्र.सं.	कार्यक्रम/योजनाको नाम	सञ्चालन भएको			स्वीकृत बजेट	जम्मा खर्च	उपभोक्ता समिति/ठेकेदार	भौतिक प्रगति	वित्तिय प्रगति	प्रगतिको अवस्था (सम्पन्न/क्रमागत/अधुरो)	कैफियत
		पालिका	वडा नं.	टोल							
१४	बालमैत्री शिक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत फर्निचर एवम् बाल उत्थान निर्माण	बा.सु.गा.पा.	विभिन्न वडाहरू (२, ३, ४, ७ र ८)	८ वडा विभिन्न विद्यालयहरू	61,50,856.19	20,58,747.00	ठेकेदार	35.00%	33.47%	क्रमागत	नयाँ ठेक्का
१५	बालमैत्री शिक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत ICT, Playground सामग्रीहरू र किताबहरू खरीद कार्य	बा.सु.गा.पा.			80,87,958.63	73,57,808.00	आपूर्तिकर्ता	100.00%	90.97%	सम्पन्न	
१६	औषधी तथा सर्जिकल सामग्री खरीद	बा.सु.गा.पा.	६	ताकुकोट	26,75,000.00	15,60,313.04	आपूर्तिकर्ता	100.00%	58.33%	सम्पन्न	



पूर्वाधार क्षेत्रको कूल बजेट र खर्च

(आ.व. २०७८/०७९ vs २०७९/०८०)

आ.व. २०७८/०७९ को

कूल बजेट : २२,८४,०७,६००/-

कूल खर्च : १७,२०,११,६८७.४७/-

वित्तीय प्रगति : ६६.७७ %

आ.व. २०७९/०८० को


कूल बजेट : २३,९९,३७,७८७/-

कूल खर्च : १७,८४,१२,१८७.८७/-


वित्तीय प्रगति : ७४.३६ %

पूर्वाधार क्षेत्रको कूल बजेट र खर्च

(आ.व. २०७८/०७९ vs २०७९/०८०)

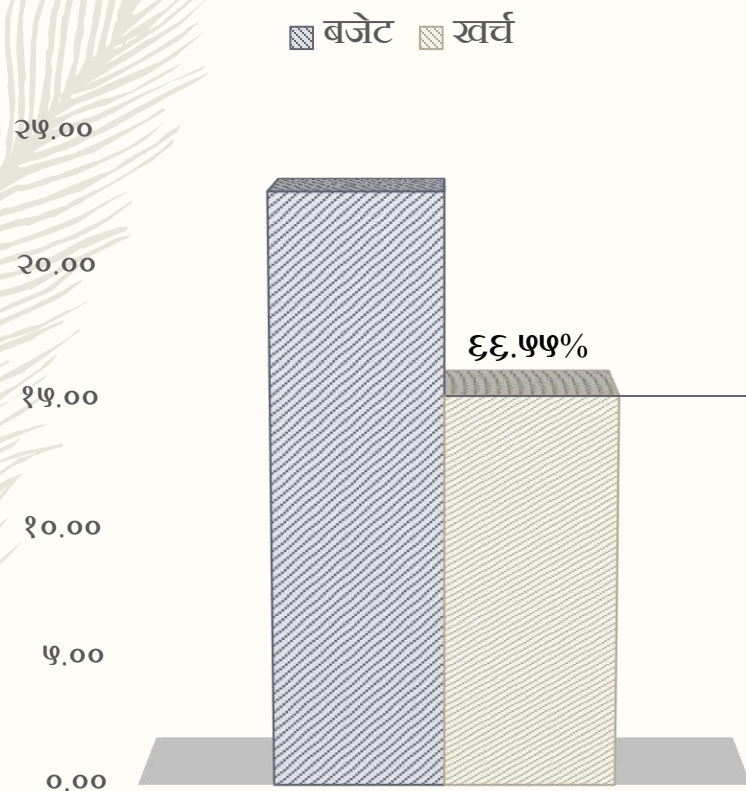

२०७८/०७९ को कूल बजेट र खर्च

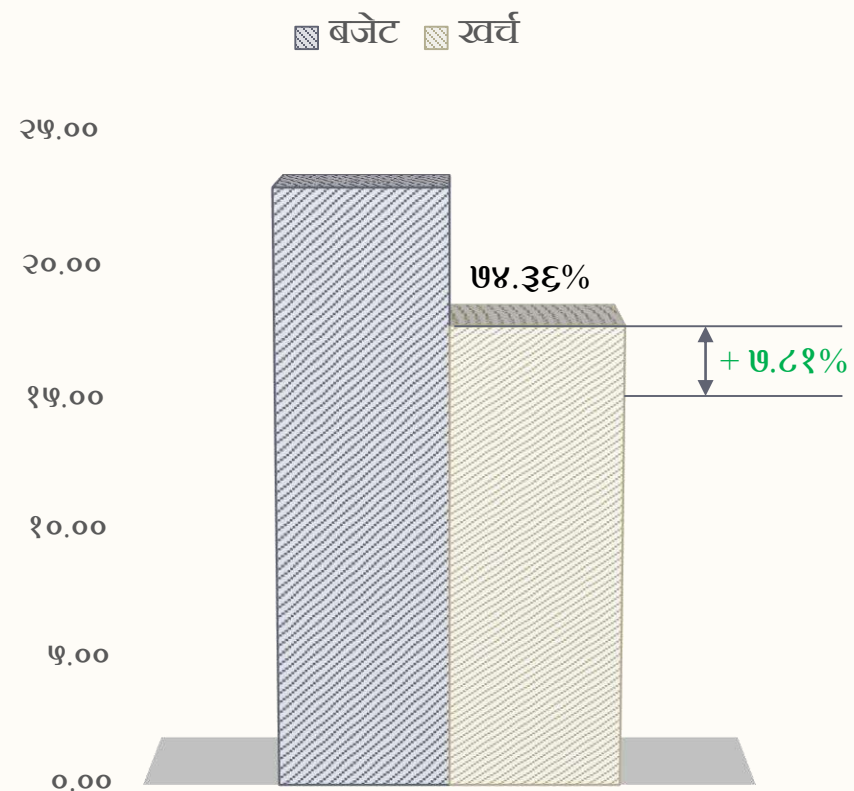

२०७९/०८० को कूल बजेट र खर्च



आ.व. २०७९/०८० मा निर्मित पूर्वाधारहरूको समीक्षा



सडक पूर्वाधारतर्फ

- पुर्णरूपमा नयाँ ट्रयाक निर्माण भएको/खनिएको (जम्मा लम्बाइ) : ४.४८ कि.मि.
- स्तरोन्नतितर्फ सडक चौडा गरिएको (जम्मा लम्बाइ) : ४.७८ कि.मि.
- स्तरोन्नतितर्फ सोलिङ्ग मात्र भएको (जम्मा लम्बाइ) : १३०३.० मि.
- स्तरोन्नतितर्फ आर.सि. सी ढलान भएको (जम्मा लम्बाइ) : २८०.३९ मि.
- ग्राभेल भएको (जम्मा लम्बाइ) : ५.८२ कि.मि.
- पक्कि नाला निर्माण भएको (जम्मा लम्बाइ) : १.१४ कि.मि.
- कलभर्ट (जम्मा सङ्ख्या) : ७ वटा
- अन्य : कज वे सोलिङ्ग ५ वटा, RCC: ३ वटा



गौरैटो बाटो (पदमार्ग) पुर्वाधारतर्फ

- स्तरोन्नतितर्फ पदमार्ग (सिँढी र छपनी) सोलिड्ग निर्माण भएको (जम्मा लम्बाइ) : ५२३२.६० मि.
- स्तरोन्नतितर्फ आर. सि. सी ढलान भएको (जम्मा लम्बाइ) : २५१.९५ मि.


भवन पुर्वाधारतर्फ

- नयाँ थालनी सामुदायिक भवनहरु (आर. सी. सी) (जम्मा सङ्ख्या) : १ वटा
- नयाँ थालनी सामुदायिक भवनहरु (आर. सी. सी बाहेक अन्य) (जम्मा सङ्ख्या) : २ वटा
- नयाँ थालनी सामुदायिक शौचालयहरु (जम्मा सङ्ख्या) : ५ वटा (सम्पन्न)
- विद्यालय भवनहरु मर्मत (जम्मा सङ्ख्या) : ८ वटा
- क्रमागत सामुदायिक भवनहरु (आर. सी. सी) (जम्मा सङ्ख्या) : २ वटा
- क्रमागत सामुदायिक भवनहरु (आर. सी. सी बाहेक अन्य) (जम्मा सङ्ख्या) : ६ वटा
- क्रमागत सामुदायिक शौचालयहरु (जम्मा सङ्ख्या) : ५ वटा
- सामुदायिक भवनहरु मर्मत (जम्मा सङ्ख्या) : ९ वटा
- अन्य (घेराबार - ३, विद्युत गृह - २, मलामी बस्ने घर - ८, प्रतिकालय - ३, स्कुल घेरावार - २, आरन संरक्षण - २)



पर्यटन पुर्वाधारतर्फ

- नयाँ थालनी पार्कहरू (जम्मा सङ्ख्या) : ३ वटा
- क्रमागत पार्कहरू (जम्मा सङ्ख्या) : २ वटा
- मन्दिरहरू (जम्मा सङ्ख्या) : १० वटा
- चर्चहरू (जम्मा सङ्ख्या) : १ वटा
- अन्य धार्मिक भवनहरू (जम्मा सङ्ख्या) : २ वटा
- चौतारा सुधार अन्तर्गत (जम्मा सङ्ख्या) : ५ वटा



खेल मैदान पुर्वाधारतर्फ

- आर.सि.सि./पि.सि.सि ढलानयुक्त खेलमैदान निर्माण/मर्मत/स्तरोन्नति (जम्मा सङ्ख्या) : १ वटा
- आर.सि.सि./पि.सि.सि ढलान वाहेकका खेलमैदान निर्माण/मर्मत/स्तरोन्नति (जम्मा सङ्ख्या) : ५ वटा
- खेलमैदान घेरावार भएको (जम्मा सङ्ख्या) : १ वटा
- अन्य gabion: 13

खानेपानी तथा सरसफाई पुर्वाधारतर्फ

- नयाँ खानेपानी ट्याङ्की निर्माण (जम्मा सङ्ख्या र आयतन लिटर) : ११ वटा, (जम्मा आयतन : ८८००० लिटर)
- खानेपानी ट्याङ्की मर्मत (जम्मा आयतन लिटर): ३ वटा
- खानेपानी पाइपलाइन विस्तार (जम्मा लम्बाइ) : १०,१०० मि. पाइप
- खानेपानि सामुदायिक धारा बिस्तार (जम्मा सङ्ख्या) : ६ वटा
- एक घर एक धाराबाट लावान्वित घर धुरी (जम्मा सङ्ख्या) : १२४ वटा
- नयाँ ढल / नाली निर्माण (जम्मा लम्बाइ) : २६८० मि.
- अन्य Intake: 5 Nos, कुवा: 2 वटा



भूमि व्यवस्थापनतर्फ

- भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित वसोवासीको लगत संकलन तथा निस्सा प्रिन्ट गरीएको;
- सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको विवरण तयार गरीएको;
- बारपाक ढल निकास तथा प्रशोधन गृहको लागि जग्गा प्राप्ती तथा दाखिला खारेजको कार्य समापन गरीएको;
- रंगशाला निर्माणका लागि होम बहादुर श्रेष्ठको थप जग्गा प्राप्ती तथा दाखिला खारेजको कार्य समापन गरीएको;
- सौरपानी आयुवेदको जग्गा गोरखा नापी कार्यालयको सर्वेक्षकको सहयोगमा चौहदी नापजाँच तथा सर्वेक्षणको कार्य समापन गरीएको;
- बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका वार्ड न. १ र २ को सार्वजनिक जग्गाको खोज तथा नापजाँच कार्य गरीएको;
- स्वाँरा स्वास्थ्य चौकी र रंगशाला निर्माणका लागि थप जग्गाको प्रतिवेदन सहित दाखिला खारेजका लागि कार्य अगाडी बढाएको ;
- नापी कार्यालय गोरखाको सहयोगमा भू-उपयोग क्षेत्र तथा जग्गा वर्गीकरणको कार्य अन्तिम चरणमा रहेको ;



भूमि व्यवस्थापनतर्फ

- बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका वार्ड नं. ६ स्थित पाल्खुमा वार्ड कार्यालय निर्माणका लागि वडा अध्यक्षको नेतृत्वमा आवश्यक जग्गाको खोज तथा सर्वेक्षण सहित प्रतिवेदन तयार गरेको;
- बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका वार्ड नं. २ बारपाकको स्वास्थ्य चौकी निर्माणका लागि वडा अध्यक्ष तथा वडा सदस्यको नेतृत्वमा जग्गाको खोज तथा सर्वेक्षण गरेको;
- बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका भरिका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको विवरण सहित खोज तथा सर्वेक्षणको कार्य भइ रहेको;
- गाउँपालिका तथा वडा कार्यालयमा प्राप्त निवेदनका आधारमा सम्बन्धित वडाका वडा अध्यक्ष तथा वडा सदस्यको रोहवरमा सामुदायिक संस्था तथा व्यक्तिगत जग्गाको नापजाँचको कार्य गरेको ।



आ.व. २०८०/०८१ का कार्ययोजनाहरू

- पुराना घरहरूको अभिलेखीकरण ;
- घर नक्सा पास कार्यलाई निरन्तरता ;
- एक वडा एक पार्क निर्माण ;
- चौतारा सुधार ;
- वडा-गाउँपालिका सडकको स्तरोन्नति ;
- पर्यटनमुखी गाउँपालिकाको निर्माण ;
- प्राविधिक सीपमूलक तालिम सञ्चालन (Staffs, Users Committee, Workers) ;
- प्राविधिक प्रयोगशाला संचालन गराउने ;
- प्रयोगशालीय परीक्षणका आधारमा परिमाण र गुणस्तरमा कडाइ ;
- गा.पा. अन्तर्गतका पूर्वाधारहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन ।

Work Schedule Plan 2080/081

क्र.स.	कार्यक्रम	समय
टेण्डरसम्बन्धी कार्य		
१	पहिलो टेण्डर	भदौको पहिलो हप्ता
२	आशयको सूचना प्रकाशन	असोजको दोस्रो हप्ता
३	योजना सम्झौता/कार्यादेश	असोजको तेस्रो/चौथो हप्ता
४	दोस्रो टेण्डर (बाँकी ठूला योजना)	असोजको महिना
५	आशयको सूचना प्रकाशन	कात्तिक महिना
६	योजना सम्झौता/कार्यादेश	मङ्सिर महिना

Work Schedule Plan 2080/081

क्र.स.	कार्यक्रम	समय
उपभोक्ता समितिसम्बन्धी कार्य		
१	समिति Orientation कार्य	भदौ महिनाको पहिलो/दोस्रो हप्ता
२	योजना समिति गठन	भदौ महिनासम्म
३	फिल्ड सर्भे	भदौ-असोज महिनासम्म
४	डिजाइन/इस्टिमेट	भदौ, असोज, कात्तिक, मङ्सिर र पुस महिनासम्म
नोट: पुस मसान्तसम्म सबै सम्झौता सक्नुपर्ने, नसकेमा योजना रकमान्तर हुने;		
५	योजना अनुगमन तथा भुक्तानी	माघ, फाल्गुन

Work Schedule Plan 2080/081

क्र.स.	कार्यक्रम	समय
अन्य कार्य		
१	घर नक्सा पास/अभिलेखीकरण	निरन्तरता
२	प्राविधिक तालिम	भदौ महिना
३	कामदार तालिम	भदौ महिना
४	उपभोक्ता समितिलाई तालिम	असोज महिना



समस्याहरू

- आवश्यक तालिमको कमी;
- दक्ष कामदारको कमी;
- काम गर्ने गलत तरिका;
- कामसम्बन्धी ज्ञानको कमी;
- काममा ठगी (Quality/Quantity);
- निर्माण सामग्रीको गुणस्तर;
- भूगोल;
- जनश्रमदान/जनसहभागिता;



प्राविधिक ल्याव (किन्न ?)

- ✓ निर्माण सामग्रीको गुणस्तर चेक/जाँच गरी कार्यको गुणस्तर कायम राख्न;
- ✓ कार्यको गुणस्तर चेक/जाँच गर्न;
- ✓ गुणस्तरहीन कार्य गर्ने उपभोक्ता समिति, निर्माण व्यवसायी तथा अन्यलाई कारवाही गर्न;
- ✓ कार्य मुल्यांकनलाई आधार दिन;
- ✓ अन्य ।

प्राविधिक ल्याव (के गर्छ ?)

— Slump Cone



प्राविधिक ल्याव (के गर्छ ?)


— Automatic Digital Compression Test



प्राविधिक ल्याव (के गर्छ ?)

— Concrete Hammer





पूर्वाधार ल्याव (के गर्छ ?)

- Flexure Test
- Aggregate Impact Test
- Sieve Analysis
- Loss Angeles Abrasion Testing Machine
- Dynamic Cone Penetration Test
- Liquid/Plastic/Shrinkage Limit Test

आ.व. २०७९/०८० का केहि उत्कृष्ट कार्यहरू (वडा-०२)



बारपाक भ्यू-टावर,
बारपाक

आ.व. २०७९/०८० का केहि उत्कृष्ट कार्यहरू (वडा-०३)



रातेमाटे स्तुलखोला
फड्के, स्वाँरा

आ.व. २०७९/०८० का केहि उत्कृष्ट कार्यहरू (वडा-०४)



साखोला फड्के पुल, सौरपानी

आ.व. २०७९/०८० का केहि उत्कृष्ट कार्यहरू (वडा-०४)




थानिथान मन्दिर

આ.વ. ૨૦૧૭/૦૮૦ કા કેહિ ઉત્કૃષ્ટ કાર્યહરુ (વડા-૦૪)



ઢોડેની સૌરપાની સડક
સ્તરઁન્નતિ

आ.व. २०७९/०८० का केहि उत्कृष्ट कार्यहरू (वडा-०४)

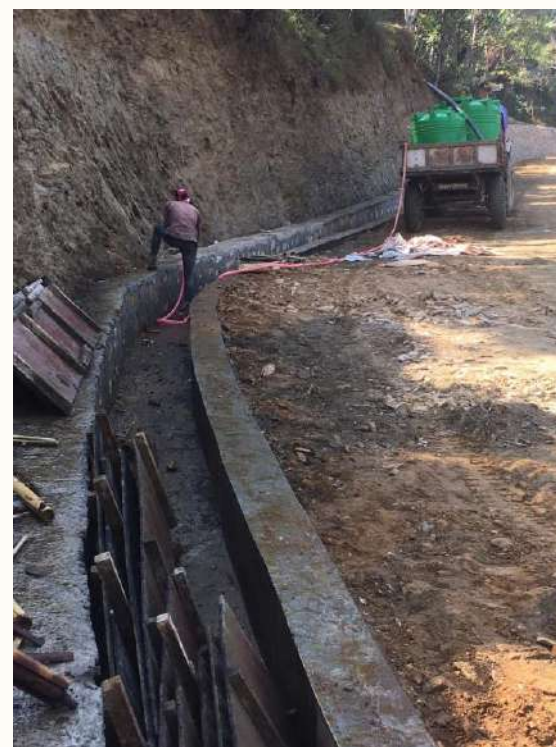

ढोडेनी सौरपानी सडक स्तरउन्नति

आ.व. २०७९/०८० का केहि उत्कृष्ट कार्यहरू (वडा-०५)



चनौटे पाल्खु सडक
स्तरोन्नति

आ.व. २०७९/०८० का केहि उत्कृष्ट कार्यहरू (वडा-०६)



मसार डाँडागाउँ पाल्खु सडक स्तरोन्नति, ताकुकोट (समयमा उत्कृष्ट तथा गुण्डस्तरीय कार्य सम्पन्न)

आ.व. २०७९/०८० का केहि उत्कृष्ट कार्यहरू (वडा-०७)



झाँक्रीचोक धारापानी देउराली सडक
स्तरउन्नति (वर्षाको बावजुद पनि कम
समयमा धेरै प्रगति गर्न सफल)

आ.व. २०७९/०८० का केहि उत्कृष्ट कार्यहरू (वडा-०८)



मसेल जराङ पन्डुङ सडक स्तरोन्नति, जराङ

आ.व. २०७९/०८० का केहि उत्कृष्ट कार्यहरु



सडक हेरातु राखिएको जिल्लामा पहिलो सरकारी निकाय

आ.व. २०७९/०८० का केहि उत्कृष्ट कार्यहरु



दिल बहादुर रम्तेल स्मृति पार्क

आ.व. २०७९/०८० का केहि उत्कृष्ट कार्यहरु



गाउँपालिका भवनको इन्टेरीयर कार्य

धन्यवाद !!!



बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका
ताकुकोट, गोरखा



भौतिक पूर्वाधार
विकास शाखा

